

Angel Vidal Troncoso

ING. CIVIL

CEDULA No. 023-0027674-4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Proyecto: Construcción Mercado Municipal Ramón Santana

Fecha de inicio: 07/11/2022

Fecha de termino:

No.	Actividades	Duración (días)	Fecha de inicio	Fecha de Termino	Partida Predecesora
1	Acondicionamiento del Solar	3	7/11/2022	9/11/2022	
2	Bote desperdicios	3	9/11/2022	11/11/2022	1
3	Charranchar	2	12/11/2022	13/11/2022	2
4	Replanteo	4	14/11/2022	17/11/2022	3
5	Excavación Zapata Muros de 8"	8	18/11/2022	25/11/2022	4
6	Excavación Zapata Muros de 6"	1	18/11/2022	18/11/2022	4
7	Excavación Zapata Columna	10	18/11/2022	27/11/2022	4
8	Fumigación #1	1	28/11/2022	28/11/2022	5,6,7
9	Zapata Muros de 8" (Hormigón Industrial 210Kg/Cm2)	7	28/11/2022	4/12/2022	8
10	Zapata Muros de 6" (Hormigón Industrial 210Kg/Cm2)	1	28/11/2022	28/11/2022	8
11	Zapata Columnas	7	28/11/2022	4/12/2022	8
12	Bloques 1er nivel	10	5/12/2022	14/12/2022	9,10
13	Confección de columnas de 1er Nivel	10	6/12/2022	15/12/2022	11
14	Confección de vigas 1er nivel	17	16/12/2022	1/1/2023	13
15	Relleno de caliche 1er nivel	6	16/12/2022	21/12/2022	13
16	Dinteles 1er nivel	2	12/12/2022	13/12/2022	12
17	Losas plana 1er Nivel	15	2/1/2023	16/1/2023	14
18	Bloques de 20 cm (2do nivel)	4	17/1/2023	20/1/2023	17
19	Dinteles 2do nivel	2	19/1/2023	20/1/2023	18
20	Confección de Columnas de 2do nivel	10	21/1/2023	30/1/2023	18
21	Confección de Vigas 2do Nivel	15	1/2/2023	15/2/2023	20
22	Losas plana 2do Nivel	15	16/2/2023	2/3/2023	21
23	Bloques de 15 cm (Antepecho)	2	3/3/2023	4/3/2023	22
24	Fraguache losas, vigas y columnas	44	2/2/2023	17/3/2023	15,22
25	Pañete De mezcla (paredes interior y exterior)	50	5/2/2023	26/3/2023	15,22
26	Cantos	50	8/2/2023	29/3/2023	25
27	Fino de mezcla techo Plano	5	17/3/2023	21/3/2023	23
28	Zabaleta	2	22/3/2023	23/3/2023	27
29	Impermeabilizante techo planos	7	24/3/2023	30/3/2023	28
30	Piso pulido (1er nivel)	5	5/4/2023	9/4/2023	25
31	Piso pulido (2do nivel)	5	9/4/2023	13/4/2023	25
32	Cerámica en piso de baños (1er nivel)	7	15/2/2023	21/2/2023	25
33	Cerámica de piso en Baños (2do nivel)	15	19/3/2023	2/4/2023	25
34	Cerámica en piso de oficina (2do nivel)	3	19/3/2023	21/3/2023	25
35	Escalera pulida	3	15/4/2023	17/4/2023	31
36	Instalaciones sanitarias	99	2/1/2023	10/4/2023	12
37	Instalaciones electricas	140	12/12/2022	30/4/2023	12
38	Instalacion de puertas enrollables	2	14/4/2023	15/4/2023	31
39	Puertas polimetel	3	14/4/2023	16/4/2023	31
40	Puertas en divisiones de baños	2	14/4/2023	15/4/2023	31
41	Ventana Salomónica	7	30/3/2023	5/4/2023	26
42	Pintura edificación	30	1/4/2023	30/4/2023	26
43	Plafond plancha (baños nivel 1)	7	5/4/2023	11/4/2023	33
44	Plafond plancha (baños nivel 2)	7	5/4/2023	11/4/2023	33
45	Plafond en oficinas (nivel 2)	7	5/4/2023	11/4/2023	34
46	Traga luz en PVC	7	1/4/2023	7/4/2023	29
47	Baranda Escalera	3	7/4/2023	9/4/2023	35
48	Limpieza general	143.00	15/12/2022	7/5/2023	12


Angel Vidal

Ing. Angel Vidal Troncoso
Codia: 8148

ANGEL VIDAL TRONCOSO
Ingeniero Civil
RNC: 023-0027674-4
CODIA: 8148 / RPE: 10927

ORIGINAL

DIAGRAMA DE GANTT MERCADO MUNICIPAL RAMÓN SANTANA

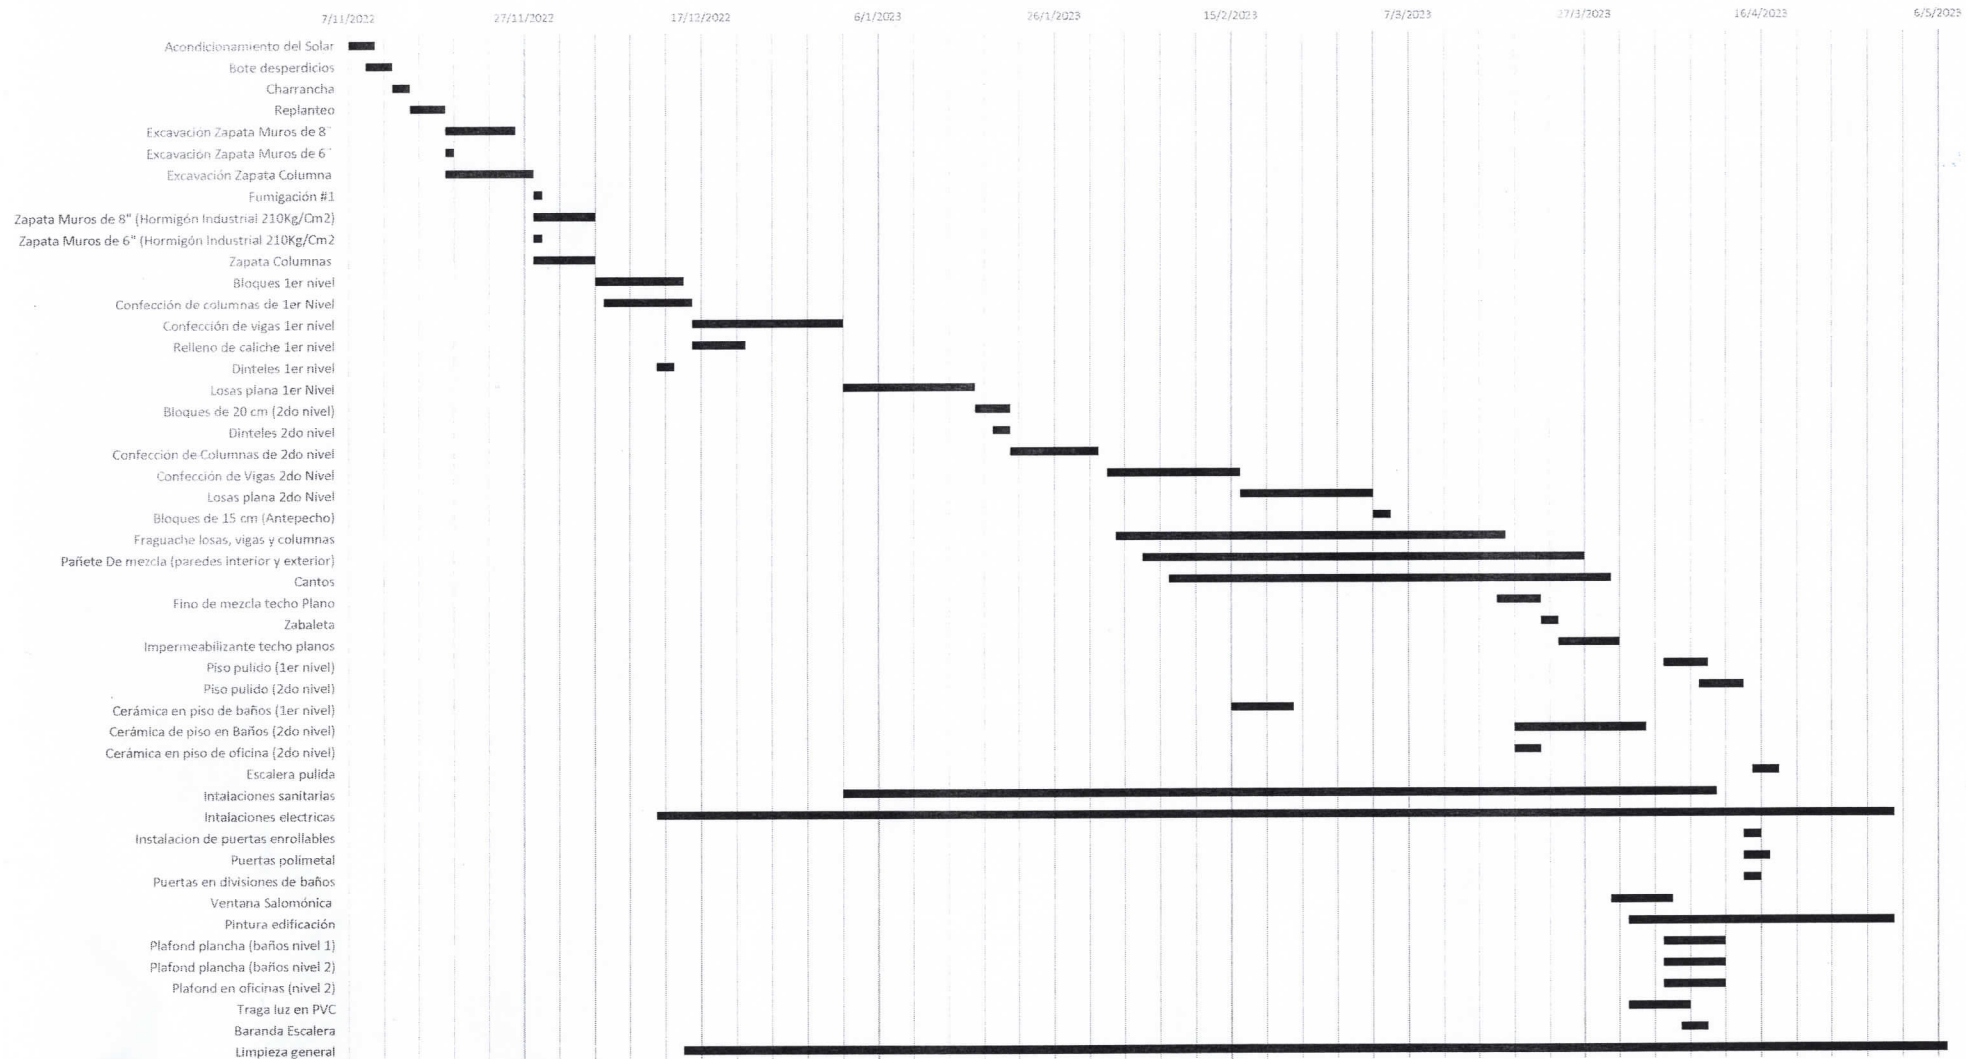

Angel Vidal

ANGEL VIDAL TRONCOSO
Ingeniero Civil
RNC: 023-0027674-4
CODIA: 8148 / RPE: 10927

ORIGINAL ORIGINAL
